

7月から新庁舎敷地造成 (第2期)工事が始まりました!



「敷地造成(第1期)工事」による地盤改良後の敷地の様子。
今年度中に敷地に盛土等を行う造成工事と建物の杭工事を
実施予定。

令和4年4月から設計業務などを開始した「中出張所等複合新庁舎整備事業」は、庁舎設計と敷地造成工事の一部が完了したところです。今号では、事業の進捗状況の詳細や、今後のスケジュール等についてお知らせします。

中出張所新聞

No.10

令和5年7月7日

発行：隠岐の島町役場

中出張所

〒685-0434

隠岐の島町中村 1541-4

Tel.4-0002



① 新庁舎整備事業の進捗状況について

● 庁舎設計と敷地造成工事(一部)が完了

令和4年度事業として、建物等の建設内容の詳細を設計する建築設計業務と、庁舎敷地の造成設計業務を実施しました。

また、本年2月〜3月には敷地造成(第1期)工事を実施し、敷地の地盤改良を行いました。

② 新庁舎整備事業スケジュールについて

● 今年度は敷地盛土と杭工事を実施

7月から敷地の盛土などを行う敷地造成(第2期)工事を開始しました。年明けからは建物本体の建築工事にとりかかり、3月末までに杭工事を実施予定です。

● 事業完了を令和7年3月末に変更

当初、令和6年9月末の事業完了予定としておりましたが、工事内容の変更等により、令和7年3月末に変更となりました。

● 現中出張所などの跡地利用も検討予定

新庁舎建築後に空き施設となる中出張所等の活用方針を審議する検討委員会も今後実施予定です。

事業スケジュール

項目	R5年度												R6年度																	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
敷地造成(第2期)工事				→																										
				盛土工事																										
建築工事																														
														→																

R7年3月末
事業完了※予定

③新庁舎最新デザイン



外観建物右手から




外観建物左手から



出張所側入り口



外観正面

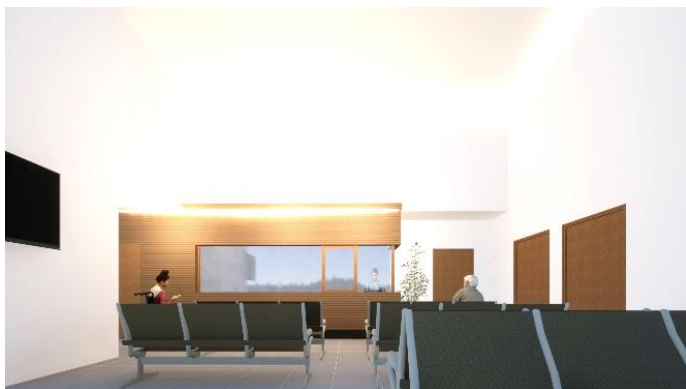

診療所待合室



出張所待合室



多目的ホール



エントランスホール

③新庁舎最新デザインについて
建築設計の完了により、新庁舎のより精巧なデザインが完成しました。
出張所事務室前ホールや多目的室、エントランスホールの床や外壁の一部に隠岐産材（松・杉）を利用するなど、コスト削減に努めながらも、地域の特徴、産業を活かした温かみのある室内空間設計となっております。
